

Guarenas, 31 de marzo de 2023


Señores
Conjunto Parque Residencial Ciudad Casarapa.
Presente.-


INFORME DE RESTAURACIÓN FUENTE

Para el día 20 de septiembre del 2022, siendo las 12:20 PM, se efectuó la reunión entre la Sra. Amy Aguilar y el Comité de Servicios Generales, representados por el Sr. José González “Comisión de Seguridad” y el Sr. Luis Mora “Comisión de Obras y Servicios” para formalizar la entrega de la llave del candado del cuarto de bomba, la cual se encontraba en resguardo de la vecina Amy Aguilar.

En dicha reunión se pudo constatar el estado de los dispositivos eléctricos, tuberías, filtro y bomba de agua, se encontraban completos pero en estado de abandono y la bomba de agua obstruida en su mecanismo de rodamiento.

A continuación se anexa fotos de los diferentes componentes para el día de la entrega:

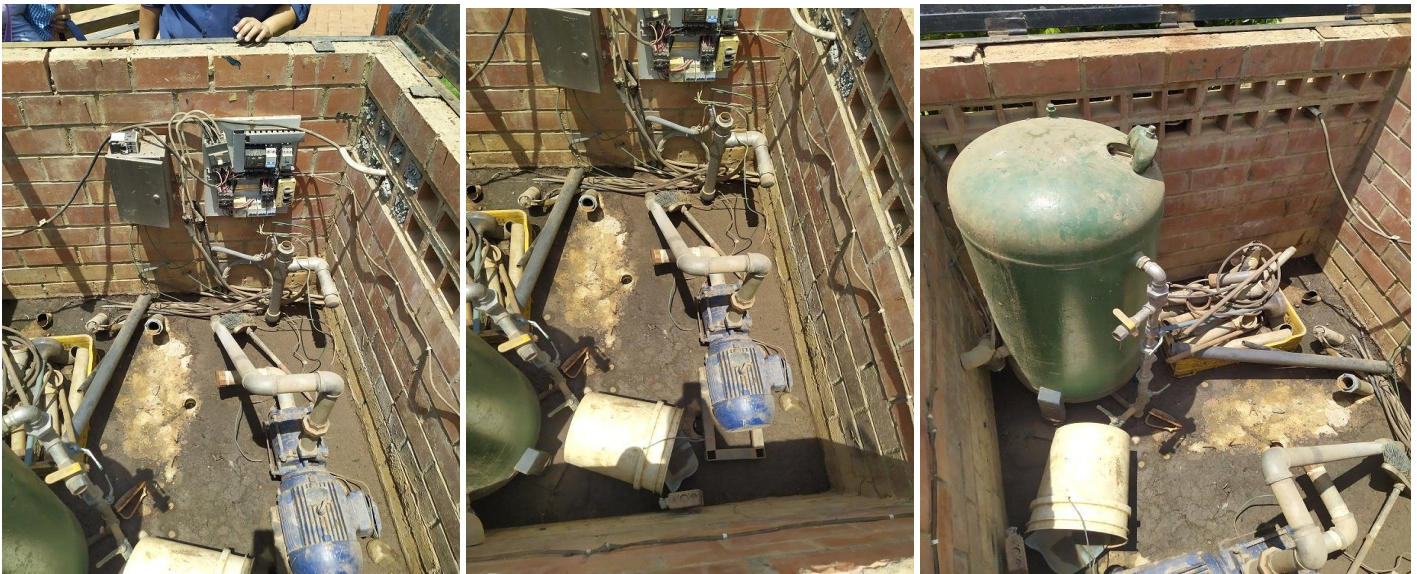

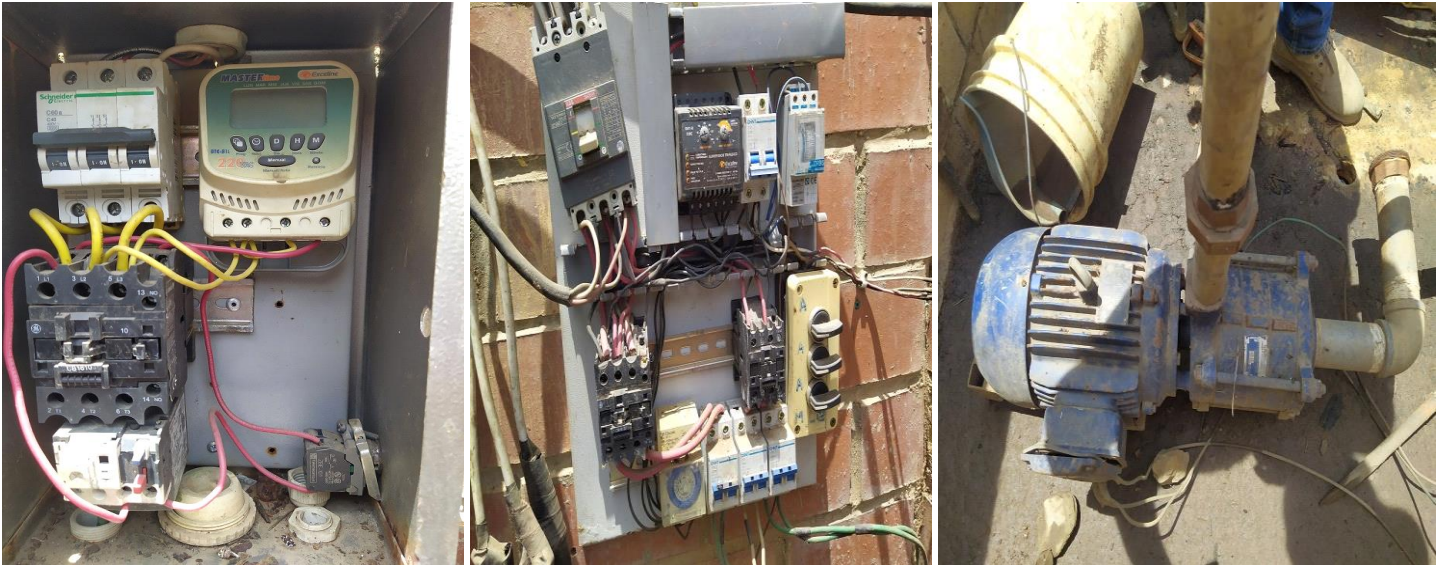

Para el mes de febrero del 2023 se da inicio la recuperación de la fuente en su primera etapa, donde se especifica a continuación los diferentes trabajos realizados.

1. Tanquilla de la fuente.

- Reparación del tablero de control.
- Revisión de los equipos electromecánicos del tablero, consiguiéndose varios dispositivos dañados, como los contactores térmicos, breakers, reloj horario.

2. Tubería de acceso a la fuente.

- Se consiguió la tubería obstruida en la cual se tuvo que realizar trabajo de rotura en el concreto para liberar la misma.
- Rotura en la fuente de sistema de inyección de fluido del volcán de la fuente.
- Limpieza de la tubería de inyección del sistema de los chorros, el cual se encontraba sellado con goma espuma y cemento.
- Limpieza del sistema de desagüe de la fuente, el cual se encontraba totalmente obstruido, se utilizó un compresor para su liberación.


3. Rotura del piso de la fuente.


- Se rompió el cemento de la salida del volcán, ya que se encontraba tapado con concreto.
- Se destapo la tubería de electricidad la cual se encontraba obstruida con cemento.
- Se desmantelo faro y rejilla del volcán de la fuente, la cual estaba dañada.
- Se realizó la reparación de la bomba, la cual se encontraba totalmente deteriorada y trancada.
- Se inspecciono la cometa de electricidad de la tanquilla de la fuente, encontrándose de que la cometa se encuentra en un edificio de la parcela 3, el cual no afecta al consumo del edificio ya que se encuentra independiente.

Se anexa reseña fotográfica de los trabajos realizados hasta el día 24 de marzo de 2023:

Reparación del tablero de control



Revisión de los equipos electromecánicos del tablero, consiguiéndose varios aparatos dañados y equipos obsoletos, como los contactores térmicos, breakers, reloj horario, los interruptores encendidos.

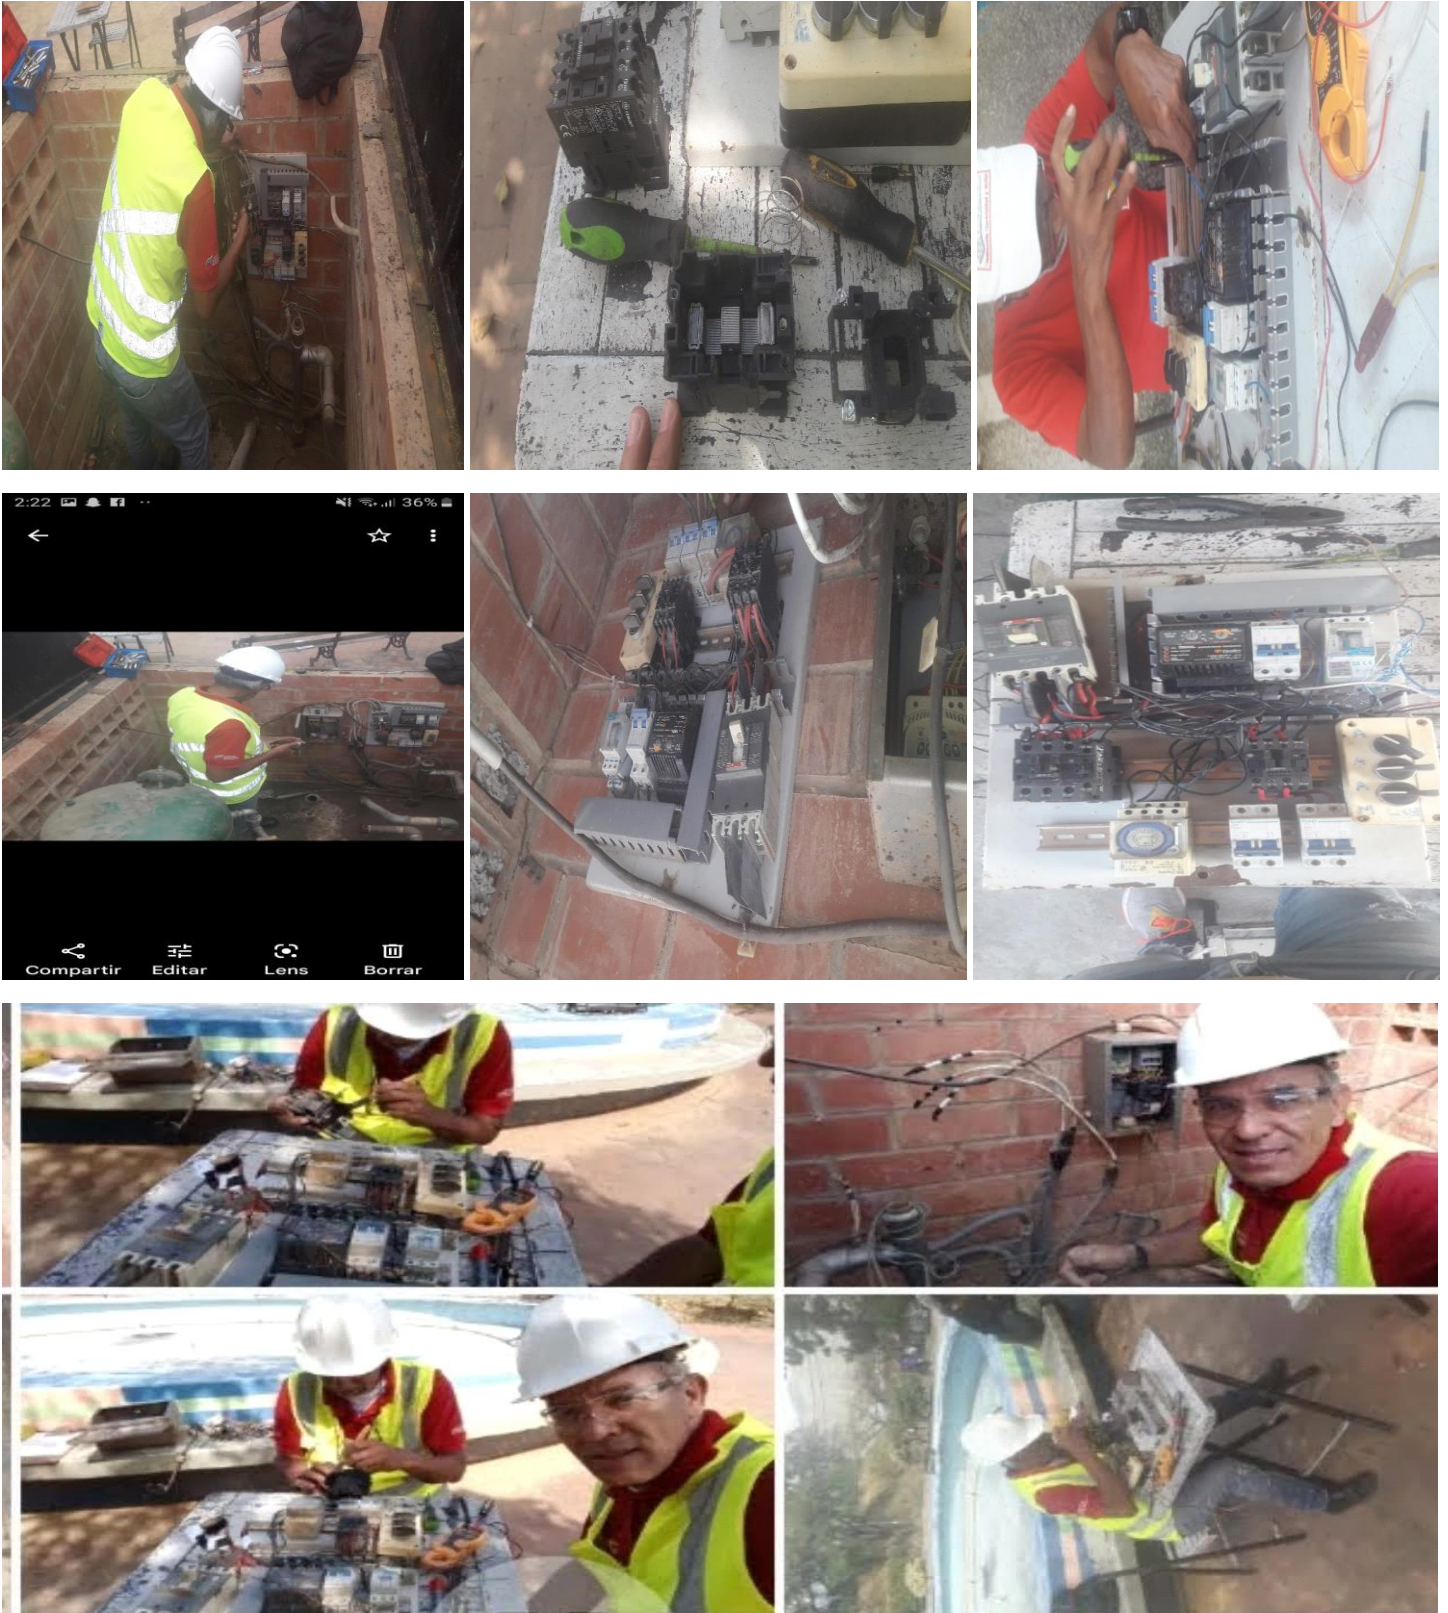

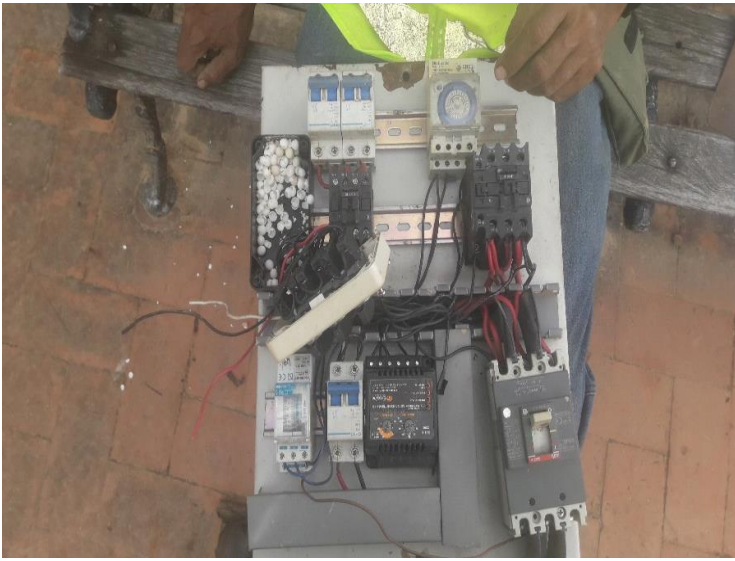

Reparación de la bomba

Se hizo reparación de la bomba la cual se encontraba totalmente deteriorada y trancada.

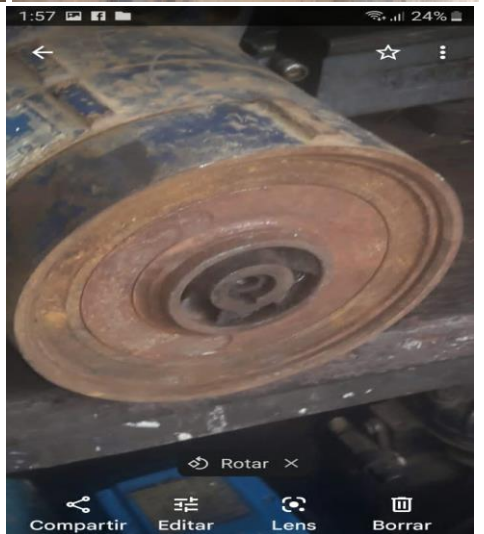
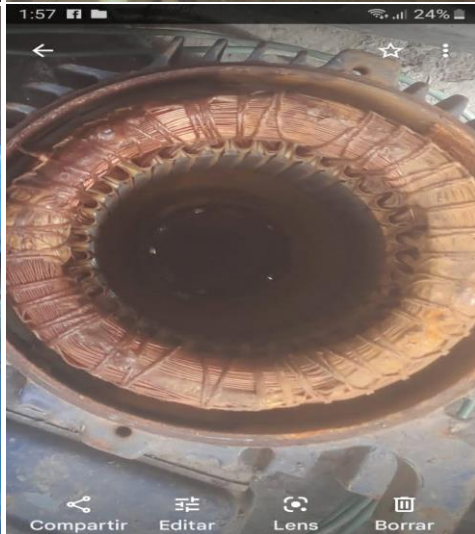




Tubería de acceso a la fuente


- Se consiguió la tubería obstruida, en la cual se tuvo que realizar un trabajo de rotura en el concreto para liberar la misma.
- Rotura en la fuente de sistema de inyección de fluido del volcán de la fuente.
- Limpieza de la tubería de inyección del sistema de los chorros, la cual se encontraba sellada con goma espuma y cemento.
- Limpieza del sistema de desagüe de la fuente, el cual se encontraba totalmente obstruido, se utilizó un compresor para este fin.



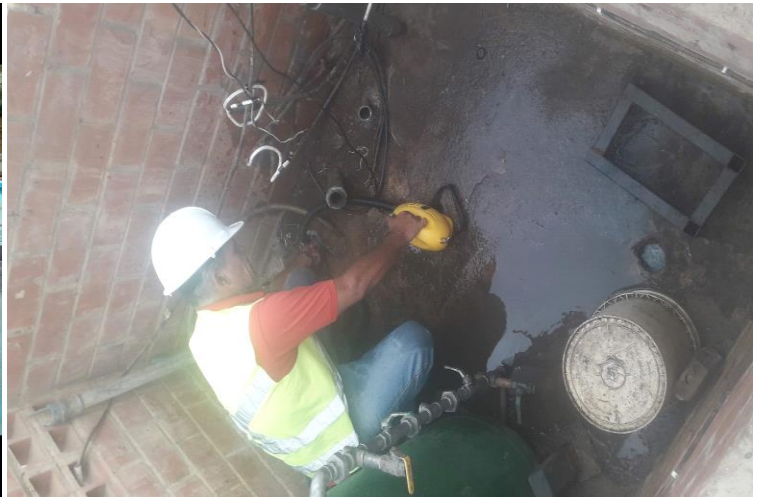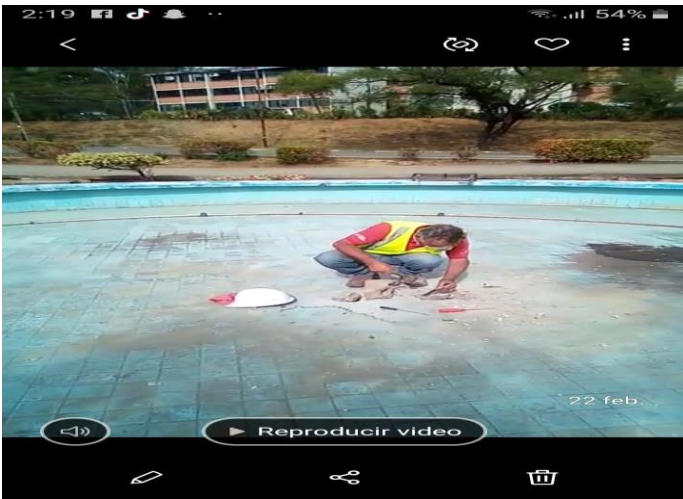

Rotura del piso de la fuente

- Se rompió el centro de la salida del volcán, ya que se encontraba tapado con concreto.
- Se destapo la tubería de electricidad, la cual se encontraba obstruida con cemento.
- Se desmantelo faro y rejilla del volcán de la fuente, la cual estaba dañada.
- Se inspecciono la cometida de electricidad de la tanquilla de la fuente, encontrándose de que la cometida se encuentra en una de las torres o edificio, la cual no afecta de ningún modo al condominio del edificio ya que se encuentra independiente.

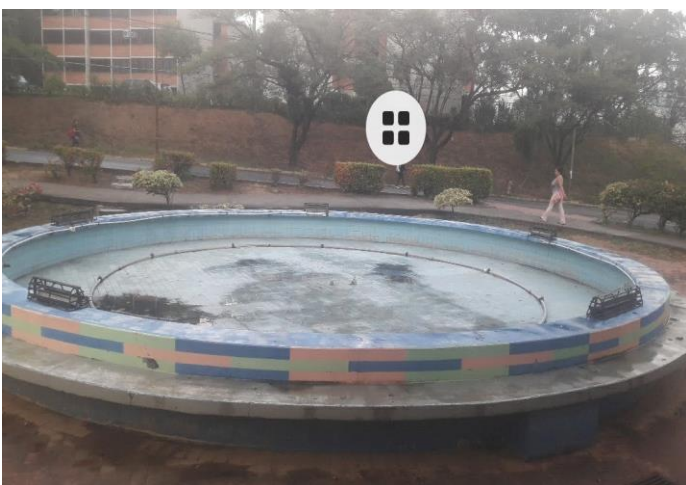

Inicio de la segunda etapa de la restauración de la fuente con limpieza de la fuente, colocación de nuevo cableado, tubería nueva y próximamente la colocación de la bomba.



Sin más a que hacer referencia, quien suscribe.

Atentamente,



Ing. Luis Mora.
Comité de Servicios Generales
Conjunto Parque Residencial Ciudad Casarapa
Período 2022-2024



Guarenas, 8 de septiembre de 2023


**Señores
Conjunto Parque Residencial
Ciudad Casarapa. Presente.-**

INFORME FINAL DE RESTAURACIÓN FUENTE

Para el día 20 de septiembre del 2022, siendo las 12:20 PM, se efectuó la reunión entre la Sra. Amy Aguilar y el Comité de Servicios Generales, representados por el Sr. José González “Comisión de Seguridad” y el Sr. Luis Mora “Comisión de Obras y Servicios” para formalizar la entrega de la llave del candado del cuarto de bomba, la cual se encontraba en resguardo de la vecina Amy Aguilar.

En dicha reunión se pudo constatar el estado de los dispositivos eléctricos, tuberías, filtro y bomba de agua, se encontraban completos pero en estado de abandono y la bomba de agua obstruida en su mecanismo de rodamiento.

A continuación se anexa fotos de los diferentes componentes para el día de la entrega:

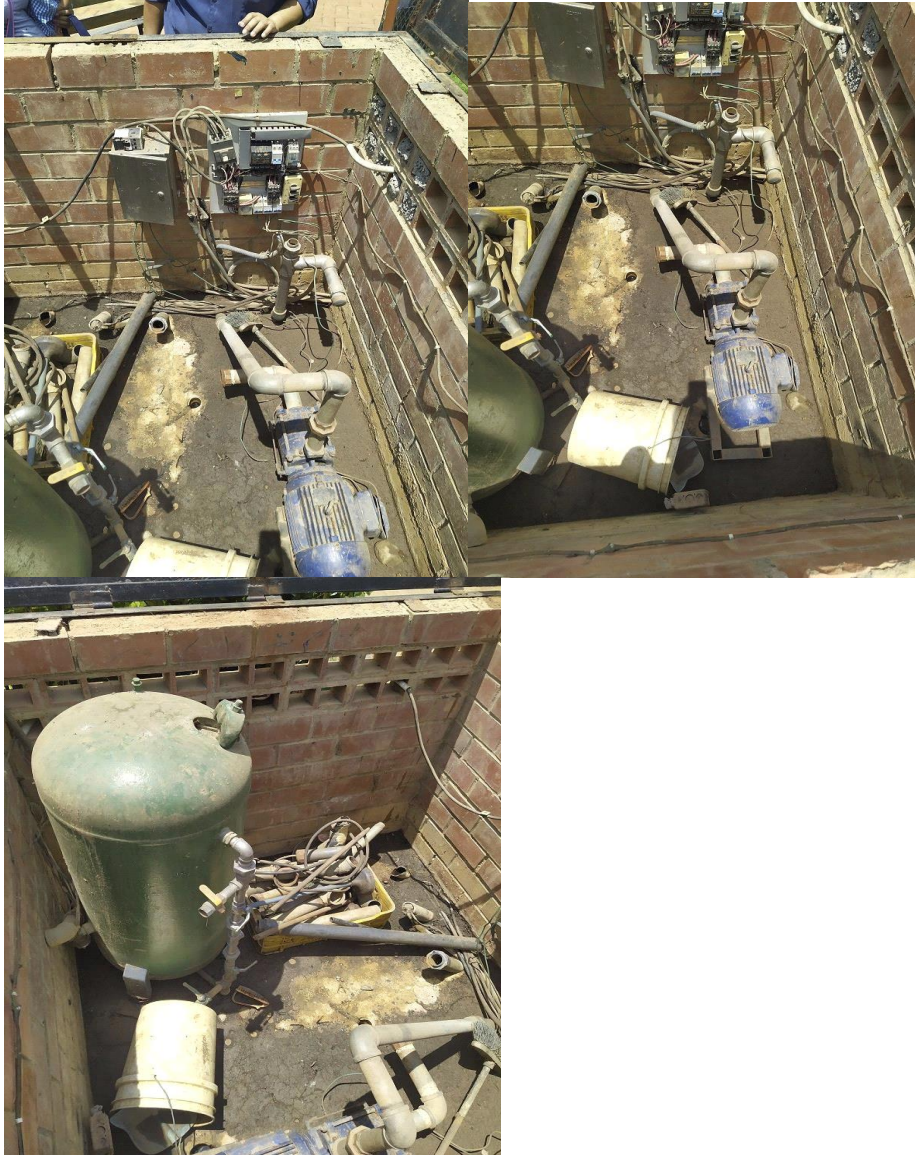

Para el mes de febrero del 2023 se da inicio la recuperación de la fuente en su primera etapa, donde se especifica a continuación los diferentes trabajos realizados.

- **Tanquilla de la fuente.**
 - Reparación del tablero de control.
 - Revisión de los equipos electromecánicos del tablero, consiguiéndose varios dispositivos dañados, como los contactores térmicos, breakers, reloj horario.
- **Tubería de acceso a la fuente.**
 - Se consiguió la tubería obstruida en la cual se tuvo que realizar trabajo de rotura en el concreto para liberar la misma.



- Rotura en la fuente de sistema de inyección de fluido del volcán de la fuente.
 - Limpieza de la tubería de inyección del sistema de los chorros, el cual se encontraba sellado con goma espuma y cemento.
 - Limpieza del sistema de desagüe de la fuente, el cual se encontraba totalmente obstruido, se utilizó un compresor para su liberación.
- **Rotura del piso de la fuente.**
 - Se rompió el cemento de la salida del volcán, ya que se encontraba tapado con concreto.
 - Se destapo la tubería de electricidad la cual se encontraba obstruida con cemento.
 - Se desmantelo faro y rejilla del volcán de la fuente, la cual estaba dañada.
 - Se realizó la reparación de la bomba, la cual se encontraba totalmente deteriorada y trancada.
 - Se inspecciono la cometida de electricidad de la tanquilla de la fuente, encontrándose de que la cometida se encuentra en un edificio de la parcela 3, el cual no afecta al consumo del edificio ya que se encuentra independiente.

Se anexa reseña fotográfica de los trabajos realizados hasta el día 24 de marzo de 2023:



Reparación del tablero de control

Revisión de los equipos electromecánicos del tablero, consiguiéndose varios aparatos dañados y equipos obsoletos, como los contactores térmicos, breakers, reloj horario, los interruptores encendidos.

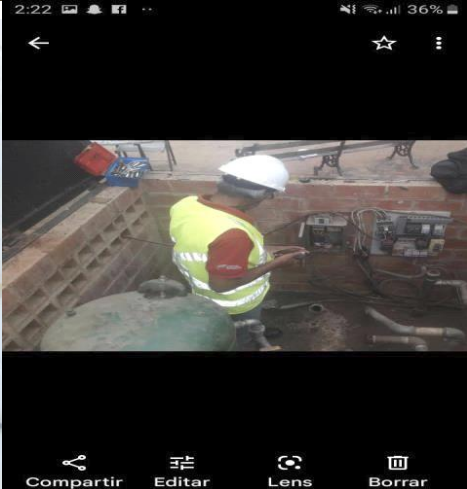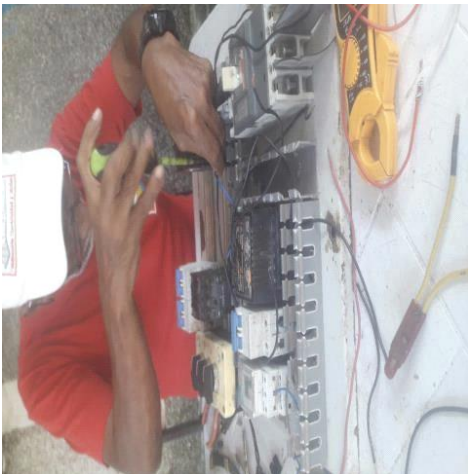



Reparación de la bomba






Se hizo reparación de la bomba la cual se encontraba totalmente deteriorada y trancada.



Tubería de acceso a la fuente

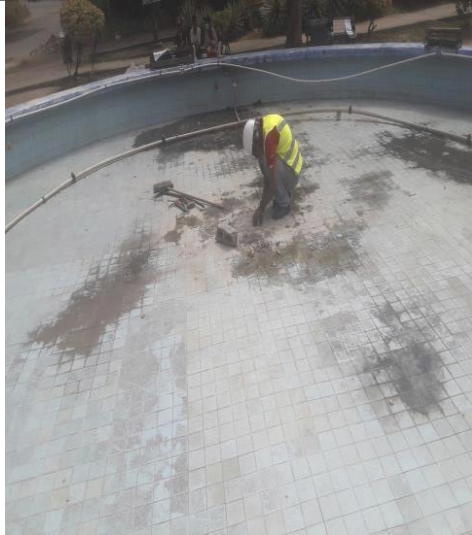


- Se consiguió la tubería obstruida, en la cual se tuvo que realizar un trabajo de rotura en el concreto para liberar la misma.
- Rotura en la fuente de sistema de inyección de fluido del volcán de la fuente.
- Limpieza de la tubería de inyección del sistema de los chorros, la cual se encontraba sellada con goma espuma y cemento.
- Limpieza del sistema de desagüe de la fuente, el cual se encontraba totalmente obstruido, se utilizó un compresor para este fin.

Rotura del piso de la fuente





- Se rompió el centro de la salida del volcán, ya que se encontraba tapado con concreto.
- Se destapo la tubería de electricidad, la cual se encontraba obstruida con cemento.
- Se desmantelo faro y rejilla del volcán de la fuente, la cual estaba dañada.
- Se inspecciono la cometida de electricidad de la tanquilla de la fuente, encontrándose de que la cometida se encuentra en una de las torres o edificio, la cual no afecta de ningún modo al condominio del edificio ya que se encuentra independiente.

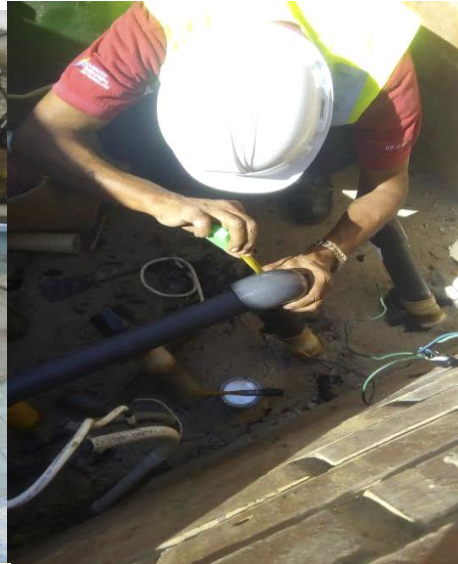

Para el 18 de abril de 2023 se inicia la segunda fase de recuperación de la fuente, la cual comprende en la colocación de nuevas tuberías, cableado, picos de chorros, hongos de chorros, volcán, entre otros.

Entre los materiales adquiridos para completar el 80% los trabajos de la fuente se encuentran los siguientes:

- 2 Tubos de 1 1/2".
- 5 Codos de 1 1/2 de 90 grados.
- 2 Tee de 1 1/2.
- 1 Anillo de lizo rosca macho de 1 1/2.

- 1 Tapa con rosca de 1 1/2.
- 1 Buchin de 2 a 1 1/2.
- 6 Picos.
- 1 Volcán.
- 11 Hongos.

Material eléctrico:

- Térmico para proteger la bomba.
- Reloj horario.
- 1 Reflector de 200 W multicolor.
- 1 Regulador de 12 V.

Teniendo en cuenta que en la primera fase se adquirieron los siguientes materiales:

- 1 Reductor de 4x2 pulgadas.
- 1 Anillo de 2 roscas lizo.
- 1 Tee 3x2 pulgada.
- 2 Tee de 3x1 y media pulgada.
- 1 Anillo reductor de 3x1 y media pulgada.
- 1 Unión universal de 1" y media pulgada.
- 2 Anillo de 1" media pulgada.
- 6 Tee de 1 y media pulgada x 3/4.
- 1 Tubo de 1 y media pulgada de 6 metros.
- 2 Anillos de 4 pulgadas.
- 1 Reductor gucci de 4 a 2.
- 1 Metro de tubo de 2 pulgadas.
- 2 Rollos de 100 metros c/u.

A continuación memoria fotográfica de los materiales y las obras realizadas en la fuente.

























- Para el 17 de mayo se inicia el periodo de prueba de la fuente, esto con la finalidad de verificar y corregir posibles fallas en el sistema de distribución de la fuente.
- Luego de 48 horas de trabajos se pudo constatar que el sistema presentaba fuga de agua en varias conexiones en el cuarto de bomba.
- Para el 26 de mayo se volvió a reiniciar las pruebas, luego de haber solventado las fugas de agua y en esta oportunidad la fuente estuvo trabajando por 10 días continuos en intervalos de tiempo.
- Para el 15 de junio se procede a abrir al mismo tiempo todos los picos de los diferentes chorros de agua y se observa una insuficiencia en la presión del sistema de agua, lo que lleva a paralizar el funcionamiento de la fuente y revisar la bomba, donde se pudo constatar que dicha bomba no tenía los suficientes HP para soportar todos los picos de agua al mismo tiempo.
- Se procedió a buscar una alternativa con el taller donde fue reparada la bomba de la fuente y se pudo lograr un intercambio por otra bomba de mayor HP pagando un diferencial de 150\$ para concretar el intercambio.
- El 1 de julio se inició nuevamente las pruebas de funcionamiento continuo de la fuente, que tuvo una duración 45 días, donde se pudo obtener un excelente resultado y así concluir para el 18 de agosto la segunda fase que constataba de pruebas.

- 19 de agosto se pone en marcha la tercera fase que implica la colocación de 7 reflectores led multicolor y reacondicionamiento en la estética de la fuente.
- 1 de septiembre se culminan los trabajos en la fuente.

Observaciones y recomendaciones

- Se requiere de forma inmediata la conexión de agua de la fuente y que la misma salga de la única toma existente que hay en el vivero.
- La fuente presenta bajo nivel de agua.
- Los trabajos de la conexión requiere de 280 metros de tubería, pero que dicha cantidad de metros pueden ser menos cuando se inicie la exploración y se pueda recuperar parte de la tubería de 1" existente del viejo sistema de distribución de agua del parque.
- Para dar comienzo a los trabajos de recuperación del sistema de agua que se conectara a la fuente se requiere de la cooperación de la **Comisión de Administración y Legal del Comité de Servicios Generales** en el pago pendiente de la factura por concepto "Mano de obra" del personal que laboro en la recuperación de la fuente.

Sin más a que hacer referencia, quien suscribe.

Atentamente,



Comité de Servicios
Generales
Ciudad Casarapa
RIF J-40160942-2

Ing. Luis Mora.
Comisión de Obras y Servicios

Comité de Servicios Generales
Conjunto Parque Residencial Ciudad Casarapa
Período 2022-2024

Nº.	PROVEEDOR	FACTURA Nº.	FECHA	DESCRIPCION / CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IVA 16%	TOTAL	OBSERVACION
1	Jardinería Agustín Centeno 19, C.A.	00010	22/3/2023	Reparación de fuente primera etapa, puesta en marcha de cañon principal, sistema de tubería y sistema eléctrico.	41.595,84	6.655,33	48.251,17	Reparación de la fuente
3	Pall Ferreteria, C.A.	00017153	4/4/2023	Reducción Pavco y lana fermetel para reparación de la Fuente.	747,14	119,54	866,68	Reducción Pavco y lana fermetel para reparación de la Fuente.
5	Jardinería Agustín Centeno 19, C.A.	00014	24/4/2023	Materiales de herrería y electricidad para conclusión de trabajo primera etapa fuente av. Principal	4.733,72	757,40	5.491,12	Materiales de herrería y electricidad para conclusión de trabajo primera etapa fuente av. Principal
7	Inversiones Trakedeport 2030, C.A.	000063	27/4/2023	Reparación de Bomba 220 Vts. 10HP, embobinado, cambio de sellos y bocinas.	13.015,00	2.082,40	15.097,40	Reparación de Bomba 220 Vts. 10HP, embobinado, cambio de sellos y bocinas de la Fuente
9	Tecno Carlucci, C.A.	5705	27/4/2023	Surtidor CH-100 1" para la Fuente.	8.127,90	1.300,46	9.428,36	Surtidor CH-100 1" para la Fuente.
11	Nathaly de los Angeles Perez	000007	5/5/2023	2 Rollos de cable 12 para la Fuente.	5.504,40	880,70	6.385,10	2 Rollos de cable 12 para la Fuente.
13	Jardinería Agustín Centeno 19, C.A.	000017	9/5/2023	Segundo abono por trabajos de reparación de fuente.	39.227,30	6.276,37	45.503,67	Segundo abono por trabajos de reparación de fuente.
15	Jardinería Agustín Centeno 19, C.A.	00023	13/7/2023	Sustitución o cambio de bomba de 7 HP a 10 HP para la fuente en la avenida principal de la urb.	7.025,50	1.124,08	8.149,58	Sustitución o cambio de bomba de 7 HP a 10 HP para la fuente en la avenida principal de la urb.
17	Machado R. Nahen Rafael	138	17/8/2023	4 Cistenas 9000 litros para llenado de la fuente.	3.810,00	609,60	4.419,60	4 Cistenas 9000 litros para llenado de la fuente.
19	Jardinería Agustín Centeno 19, C.A.	00026	30/8/2023	Compra de materiales varios de ferreteria reparación de la fuente.	11.244,64	1.799,14	13.043,78	Compra de materiales varios de ferreteria reparación de la fuente.
21	Jardinería Agustín Centeno 19, C.A.	00032	1/9/2023	Tercera etapa y entrega de la obra reparación fuente	39.348,00	6.295,68	45.643,68	Tercera etapa y entrega de la obra reparación fuente
23	Inversiones Trakedeport 2030, C.A.	000078	20/12/2023	Conexiones de tubería para agua desde el vivero a la fuente.	79.561,88	12.729,90	92.291,78	Conexiones de tubería para agua desde el vivero a la fuente.
TOTALES GENERALES					253.941,32	40.630,61	294.571,93	

SENIAT

RIF J-302353246
PALL FERRETERIA C.A.
AV. INTERCOMUNAL GUARENAS GUATIRE
AEDIF. PALL FERRETERIA PARCELA LPI
PISO PB LOCAL UNICO URB. GUATIRE
MIRANDA ZONA POSTAL 1221

RIF/C.I.: J-00367025-1
CIUDAD RESIDENCIAL CASARAPA C.A
CIUDAD CASARAPA AREAS COMUNES
REF: F002984574

FACTURA

FACTURA: 00017153 FECHA: 04-04-2023 HORA: 08:55

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	SUBTTL
6 ✓	PVC011	PAYCO REDUC. SOLD. 1x3/4 A.F SCH 01073 (G)	13,99	83,94
1 ✓	FERM01	FERMETAL LANA DE ACERO #3 400GR. (G)	163,20	163,20
		SUBTTL		247,14

STUSUF 23JAI 93TA11

Signa
10.470.645

[Signature]
KIKI KIKI

BI G (16,00%)	Bs 247,14	SUBTTL	Bs 247,14
		IVA G (16,00%)	Bs 39,54
		TOTAL	Bs 286,68

USU: YESSICA VEN: PAUL PERALES
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI CAMBIOS
DESPUES DE 48 HORAS, PARA CAMBIOS O
RECLAMOS ES OBLIGATORIO PRESENTAR
FACTURA ORIGINAL
HORARIO DEV. Y/O CAMBIOS
LUN-VIER 8AM A 12M Y 1PM 5PM

Tarjetas Bs 44,68
Adelanto Bs 242,00

PH

ORIGINAL

Z6A0007730

Reducción Pavco y lana fermetal para reparación de la Fuente.



Jardineria

Agustin Centeno 19, C.A.

Domicilio Fiscal Calle Principal, Local N° 01, Urb. Trapichito, Sector H
Frente a la Plaza Miranda, Guarenas Edo. Miranda Z.P. 1220
Tlfs.: (0412) 577.04.21 / (0412) 840.44.89

Rif.: J-50280698-9

FECHA DE EMISION	DÍA	MES	AÑO
BUENAS	24	04	2023

FACTURA N° 00014

N° CONTROL 00- 00014

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: <i>UNIONIZACION CUADRO CASARAJA</i>	
DOMICILIO FISCAL: <i>BUNENAS</i>	
TELÉFONOS	N° DE RIF: <i>J-00367025-1</i>
CONDICIONES DE PAGO: <i>CONTADO</i>	

Cant.	DESCRIPCIÓN	Pre. Unit.	TOTAL
01	MATERIALES Y ELECTRICIDAD PARA CONCLUSION DE TRABAJO PRIMERA ETAPA FUENTE AV PRINCIPAL		
		4733,72	4733,72
Jardineria Agustin Centeno 19 c.a. RIF. J-50280698-9			
FIRMA: <i>[Signature]</i>		SUB-TOTAL Bs.	4733,72
		IVA 16 % SOBRE Bs.	757,40
		TOTAL A PAGAR Bs.	5491,12
<input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> T.CREDITO <input type="checkbox"/> T. DEBITO <input type="checkbox"/> CHEQUE N°		BANCO:	

Guatipress Impresores C.A. RIF: J-25796579-0. Res. SENIAT/02/00476 del 03-03-2008. Region Capital. FACTURA. N° Control: Desde 00-00001 Hasta 00-00050. N° FACTURA Desde: 00001 Hasta: 000050. Fecha: 20-10-2022

10.470.64 *[Signature]*

ORIGINAL

Materiales de herrería y electricidad para conclusión de trabajo primera etapa fuente av. Principal



RIF: J-30129395-9 NIT: 0006449867

Esq. Calle A con 2da Avenida, Parcela 3, Centro Industrial Del Este, Guarenas
Edo. Miranda - Venezuela. Zona Postal 1214
Tele/fax: (0212) 361.11.50 - 361.14.28 - 362.70.55

FACTURA N°
5705

CONTROL N°
00-004205

ARTICULOS PARA PISCINAS Y FUENTES LUMINOSAS

FECHA DE EMISION: Guarenas, 27/4/2023 RIF N°: J-00367025-1

NOMBRE O RAZON SOCIAL: CIUDAD RESIDENCIAL CASARAPA, C.A.

DOMICILIO FISCAL: CALLE PPAL. ZONA IND. CLORI LOCAL NRO INDICA NRO 2 URB NUEVA CASARAPA GUARENAS 0412-7833589

ORDEN: COND. DE PAGO:

N/R	CANT.	CONCEPTO O DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	% ALI CUOTA	CONTADO TOTAL
-----	-------	------------------------	-----------------	-------------	---------------

11		SURTIDORES CH-100 1"	738,90		8.127,90
----	--	----------------------	--------	--	----------

TASA DE CAMBIO: Bs. 24,63 / USD publicada por el BCV

Monto Pagado en Moneda Extranjera: \$0,00
Monto 3% IGTF: \$0,00 Bs. 0,00 Total a Pagar: Bs. 9.428,36

RECIBIDO: SUB-TOTAL 8.127,90

FORMA DE PAGO: IVA 16% 1.300,46

Efectivo Cheque N° Banco: TOTAL A PAGAR Bs. 9.428,36

Graphotoca. RIF: J-30714860-8 / Calle 11-1, Edificio GE 33, Piso 3, Local B, La Urbina, Zona Postal 1073 / Telf.: (0212) 241.2659 / 241.3683
N. Provisión: SENIAT / 0101019 de Fecha 17/09/2008 Control Desde el N. 00-003251 hasta el N. 00-004250 de Fecha 15/11/2014/ Región Capital

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES NI CAMBIOS



Resumen de transferencia
Fecha: 17-05-2023 11:01 am
Número de referencia: 01496072
Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORALC.A.

Documento del Ordenante: J-300857565

Nombre del Beneficiario: TECNO CARLUCCI CA

Documento del Beneficiario: J-301293959

Cuenta a debitar: 0172-****-**-*****7710

Cuenta a acreditar: 0105-****-**-*****0368

Monto Bs: 9.428,36

Concepto: 9700 PAGO FACT 5705 GASTO 78

Resultado: Operación Exitosa

Surtidor CH-100 1" para la Fuente.

NATHALY DE LOS ANGELES PEREZ

RIF: V-163301071

FECHA

05 05 2023

N° de CONTROL 00 - 000007

Calle Principal, Edif. 02, Piso 01, Apto. 01-03, Urb. La Rosa
Conj. Resd. La Meseta Siglo 21, Guatire - Edo. Miranda
(0412) 481.68.79

FACTURA N° 0007

Nombre o Razón Social: Ciudad Residencial Casacaipa			
Domicilio Fiscal: Calle principal zona IUD clovis No 2			
Urb Ciudad Casacaipa			
Telf:	Cond. de Pago:	RIF.:	
CANTD.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
02	Rollos de cable # 12	110	5.504.40

ESTE DOCUMENTO VA SIN TACHADURAS NI ENMIENDAS

FORMA DE PAGO: EFECT. TRANSF. OTROS

N° _____

BANCO _____

Firma Conforme _____

BASE IMPONIBLE Bs.	5.504.40
I.V.A 16 % Bs.	808.70
TOTAL Bs.	6.385.10

Razón Social: CAROL COLOR IMPRESORES, C.A. Rif: J-30333043-6 Región Capital :Guatire / Telf: (0212) 344.36.52 / 344. 57.72 - Calle García Tellechea N° 3
carolcolorimpresores@gmail.com - Prov.Adm: SENIAT/01/00311/21-02-2008 Control: Desde el N° 00-000001 Hasta el N° 00-000050 Fecha: 10-11-2022

Original: Cliente

2 Rollos de cable 12 para reparación de la fuente.



Jardineria

Agustin Centeno 19, C.A.

Domicilio Fiscal Calle Principal, Local N° 01, Urb. Trapichito, Sector II
Frente a la Plaza Miranda, Guaremas Edo. Miranda Z.P. 1220
Tlfs.: (0412) 577.04.21 / (0412) 840.44.89

Rif.: J-50280698-9

FECHA DE EMISION	DIA	MES	AÑO
GUAREMAS 09 05 2023			

FACTURA N° 00017

N° CONTROL 00- 00017

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	URBANIZACIÓN CIUDAD CASAPAPA		
DOMICILIO FISCAL:	URB CIUDAD CASAPAPA GUAREMAS		
TELÉFONOS	N° DE RIF:	CONDICIONES DE PAGO	
		CONTADO.	

Cant.	DESCRIPCIÓN	Pre. Unit.	TOTAL
01	SEGUNDO ABONO POR CONCEPTO DE REPARACIÓN DE FUENTE MUNICIPAL DE LA URBANIZACIÓN	39227,30	39227,30

Jardinería

Agustín Centeno 19 c.a.

RIF. J-50280698-9

FIRMA

SUB-TOTAL Bs.	39227,30
IVA 10% SOBRE Bs.	6276,36
TOTAL A PAGAR Bs.	45503,66

EFECTIVO T.CREDITO T. DEBITO CHEQUE N° BANCO:

Qualipres Impresores C.A. RIF. J-25789579-0. Rev. SENIA/2020/476 del 03-03-2020. Regimen Capital. FACTURA. N° Control. Desde 00-00001 Hasta 00-00050. N° FACTURA Desde: 00001 Hasta: 00050. Fecha: 20-10-2022

ORIGINAL

Segundo abono por trabajos de reparación de fuente.



Jardineria

Agustin Centeno 19, C.A.

Domicilio Fiscal Calle Principal, Local N° 01, Urb. Trapichito, Sector II
Frente a la Plaza Miranda, Guarenas Edo. Miranda Z.P. 1220
Tfns.:(0412) 577.04.21 / (0412) 840.44.89

Rif.: J-50280698-9

FECHA DE EMISION	DIA	MES	AÑO
AGOSTO 13	7	2023	

FACTURA N° 00023

N° CONTROL 00- 00023

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	URBANIZACION CIUDAD CASARAJA
DOMICILIO FISCAL:	GUARENAS ESTADO MIRANDA
TELÉFONOS	N° DE RIF: J-00367025-1
	CONDICIONES DE PAGO
	CANTADO

Cant.	DESCRIPCIÓN	Pre. Unit.	TOTAL
01	SUSTITUCION O CAMBIO DE BOMBA DE 7 HP A 10 HP. PARA LA FUENTE EN LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA URBANIZACION	7025,00	7025,00
Jardineria			
Agustin Centeno 19 c.a.			
RIF. J-50280698-9			
FIRMA		SUB-TOTAL Bs.	7025,00
		IVA 6 % SOBRE Bs.	1124,10
		TOTAL A PAGAR Bs.	8149,10

EFECTIVO T.CREDITO T. DEBITO CHEQUE N° BANCO:

Guatipress Impresores C.A. RIF: J-2979679-0. Res. SENIAT 02/00-476 del 03-03-2008. Region Capital. FACTURA. N° Control: Desde 00-00001 Hasta 00-00050. N° FACTURA Desde: 00001 Hasta: 000050. Fecha: 20-10-2022

ORIGINAL

dividido 10.490.645 Q 6024700



Resumen de transferencia

Fecha: 14-08-2023 12:30 pm

Número de referencia: 02383795

Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORALC.A.

Documento del Ordenante: J-300857565

Nombre del Beneficiario: JARDINERIA AGUSTIN CENTENO 19

Documento del Beneficiario: J-502806989

Cuenta a debitar: 0172-****-**-*****7710

Cuenta a acreditar: 0102-****-**-*****9050

Monto Bs: 8.009,07

Concepto: 9700 (30) CAMBIO DE BOMBA FACT 00023

Resultado: Operación Exitosa

Sustitución o cambio de bomba de 7 HP a 10 HP para la fuente en la avenida principal de la urb.

Machado R. Nahen Rafael

FACTURA N° 000388

RIF: V-11664187-5

SERVICIO DE:

N° de Control 00- 000138

Carretera Petare - Guaremas, Km 16, Sector Ochoa, Casa N° 01, Guaremas - Edo. Miranda
Tel.: (0414) 232.74.32 - 252.43.63 - (0416) 402.99.28

Lugar de Emisión	Día	Mes	Año
GUAREMAS	17	08	2023

Nombre o Razón Social: CIUDAD RESIDENCIAL GOSARPP C.A.
Domicilio Fiscal: Calle P Zona Industrial Claris N° 2 Urb Nueva Guarema
Teléfono: 00367025-1

CANTIDAD	CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	CISTERNAS CON AGUA 9000L/m ³ Para la Fuente Principal del Urbanismo	952ps	3,810,00
4			3.810,00

Forma de Pago: Efectivo Cheque T.O. T.C.
N° 0102.0166 77.00000 36388
SUB - TOTAL: 3.810,06
L.V.A 16 % Bs. 609,06
TOTAL A PAGAR Bs. 4.419,06

IMPRESOS FARRIS, C.A. Urb. Trujillo Simon 1, Av. A, Manuel Martínez Masera, Casa 23, Jorobos B y C, Guaremas Edo. Miranda. Teléfax: (0212) 342.02.44.
Caf: (0416) 722.24.86 - 715.44.96. RIF: J-00713326-0. Pertenencia: SENLATA 01/00026 del 22/01/2006 de la provincia N° 9192 del 26/08/2007.
Publicada en Gaceta N° 38776 del 25/08/2007. 2do Folio N° de Control, desde el N° 98-000001 hasta el N° 98-000130 - Fecha: 18/03/2009 - Región Capital.
ORIGINAL DA DERECHO A CREDITO FISCAL
0102.0166 77.00000 36388



Resumen de transferencia
Fecha: 18-08-2023 12:06 pm
Número de referencia: 02437300
Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORALC.A.
Documento del Ordenante: J-300857565
Nombre del Beneficiario: NAHEN RAFAEL MACHADO
Documento del Beneficiario: V-11664187
Cuenta a debitar: 0172-****-*.*****7710
Cuenta a acreditar: 0102-****-*.*****6388
Monto Bs: 4.419,60
Concepto: 9700 (40) 4 CISTERNAS FUENTE FACT 00388
Resultado: Operación Exitosa

4 Cisternas 9000 litros para llenado de la fuente.

Jardineria
Agustin Centeno 19, C.A.
 Domicilio Fiscal Calle Principal, Local N° 01, Urb. Trapichito, Sector II
 Frente a la Plaza Miranda, Guaremas Edo. Miranda Z.P. 1220
 Tls. (0412) 577 04 21 / (0412) 840 44 89

Rif.: J-50280698-9

FECHA DE EMISION	DIA	MES	AÑO
GUAREMAS	14	09	2023

FACTURA N° 00032 N° CONTROL 00- 00032

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	URBANI ZACON CUARDO CASARAYA
DOMICILIO FISCAL	URBANI ZACON CUARDO CASARAYA
N° DE RIF	J00367025-1
TELÉFONOS	CONDICIONES DE PAGO
	CANTADO

Cant.	DESCRIPCIÓN	Pre. Unit.	TOTAL
01	PAGO TERCERA ETAPA Y ENTREGA DE LA OBRA DE REPARACIÓN FUENTE	39349,8	39349,8
Jardineria			
Agustín Centeno 19 c.a.			
PIF. J-50280698-9			
Firma			
K1121141			
Firma			
SUB-TOTAL Bs.		39349,8	
IVAN 10 % SOBRE Bs.		6295,68	
TOTAL A PAGAR Bs.		45645,48	

EFECTIVO T.CREDITO T. DEBITO CHEQUE N° BANCO:

Softpress Impresoras C.A. PIF- J-2579579-4. Res. SENAT/1218476 del 03-03-2008. Región Capital. FACTURA N° Control Desde 00-0001 Hasta 00-0000 N° FACTURA Desde: 0001 Hasta: 00050 Fecha: 20-10-2022

ORIGINAL

Bancamiga
 Banco Universal

Resumen de transferencia
 Fecha: 08-09-2023 03:21 pm
 Número de referencia: 02647827
 Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORALC.A.
 Documento del Ordenante: J-300857565
 Nombre del Beneficiario: JARDINERIA AGUSTIN CENTENO
 Documento del Beneficiario: J-502806989
 Cuenta a debitar: 0172-****-**-*****7710
 Cuenta a acreditar: 0102-****-**-*****9050
 Monto Bs: 44.856,72
 Concepto: 9700 (22) 3ERA ETAPA RECUPERACION
 FUENTE FAC 32
 Resultado: Operación Exitosa

Tercera etapa y entrega de la obra reparación fuente

INVERSIONES TRAKDEPORT 2030, C.A.

RIF: J - 30778036-3
FACTURA N° N° 000078

Vda. 2, Casa N° 22, Urb. Manuel Martinez
Manuel, Trapichito, Sector 2, Guarenas.
Telf.: (0414) 132.60.47

FECHA DE EMISIÓN		
DIA	MES	AÑO
20	12	2023

Nombre o Razón Social: **URBANIZACION CIUDAD CASARAPA**
 Domicilio Fiscal: **URBANIZACION CIUDAD CASARAPA**
 RIF: **J-00367025-1**
 Condiciones de Pago: **CONTADO**

Cent.	Concepto o Descripción	% Alícuota	Precio Unitario	TOTAL Bs.
01	EXCAVACION DE PAVIMENTOS		10605,87	10.605,87
02	STC DE TUBERIA NIGINA 1PUL		21247,45	21.247,45
03	STC DE CONCRETO		3642,42	3.642,42
04	STC ASPERSIONES		16.069,50	16.069,50
05	STC TUBERIA VIVERO		14.087,74	14.087,74
06	CONEXION A RED HIDROCAPTA		13926,90	13.926,90

Comercial
INVERSIONES TRAKDEPORT 2030, C.A.
 RIF: J-30778036-3

Forma de Pago:
 Efectivo
 Cheque No. _____
 Banco: _____

SUB - TOTAL Bs. **79561,88**
 I.V.A. **14** % SOBRE Bs.: **12729,90**
 TOTAL A PAGAR Bs. **92291,78**

N° CONTROL 00- 000078

BEOGRAFICOS, C.A., Calle Macaira, No. 14, Guatire - Edo. Miranda / Teléfonos: (0212) 341.41.89 / 341.29.18/ 344.94.09. No. De RIF: J-31250971-6.
 Resolución: N° Provisoria SENIAT/0100107 del 07/02/2008 - 150 Formas N° de Control desde N° 00-000001 hasta el N° 00-000150 - Fecha: 29/09/2012

Original Cliente

Conexiones de tubería para agua desde el vivero a la fuente.

BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen	
Fecha	20/12/2023
Numero de Identificación	50231226
Monto Abonado	39.780,94
Beneficiario	INVERSIONES TRAKDEPORT
Cuenta Abonada	0102*****20*****8851
Banco Pertenencia	BANCO DE VENEZUELA, SACA BANCO UNIVERSAL
E-mail Beneficiario	
Referencia	INV TRAKDEPORT
Canal Utilizado	Provinet

Gracias por utilizar Provinet. Su Banca por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-08-81

BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen	
Fecha	19/01/2024
Numero de Identificación	51459452
Monto Abonado	51.452,99
Beneficiario	INV TRAKDEPOR RT
Cuenta Abonada	0102*****20*****8851
Banco Pertenencia	BANCO DE VENEZUELA, SACA BANCO UNIVERSAL
E-mail Beneficiario	
Referencia	INV TRAKDEPOR
Canal Utilizado	Provinet

Gracias por utilizar Provinet. Su Banca por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-08-81
