



Comité de
Servicios Generales

Ciudad Casarapa

OBRA: CAMARAS 1ERA. Y 2DA. FASE

Fecha: 2 de abril de 2025

Informe Técnico: Proyecto de Implementación de Sistema de Cámaras de Seguridad en la Urbanización Ciudad Casarapa

Elaborado por: Alfonso Manuel Lobo

Destinatario: Junta de Condominio y Residentes de la Urbanización Ciudad Casarapa

1. Introducción

El presente informe técnico detalla las fases planificadas para la implementación de un sistema integral de cámaras de seguridad en la Urbanización Ciudad Casarapa. Este proyecto tiene como objetivo principal mejorar la seguridad y el monitoreo de las áreas comunes, disuadir la delincuencia y proporcionar evidencia visual en caso de incidentes. El proyecto se ha dividido en cinco fases estratégicas para optimizar la implementación, minimizar las interrupciones y gestionar los recursos de manera eficiente.

2. Objetivos del Proyecto

- * Incrementar la seguridad general de la urbanización.
- * Disuadir actos delictivos y vandálicos.
- * Facilitar la identificación y el seguimiento de incidentes.
- * Proporcionar herramientas para la vigilancia y el monitoreo de áreas clave.
- * Generar un registro visual de eventos para futuras referencias.



3. Fases del Proyecto

A continuación, se describen las cinco fases del proyecto de implementación del sistema de cámaras de seguridad, detallando el alcance geográfico y la infraestructura estimada para cada una:

OBSERVACION: SE CUBREN LOS DATOS DE LAS UBICACIONES DE LAS CAMARAS POR SEGURIDAD.

3.1. Fase 1: Entrada Principal hasta el Vivero y el Sendero (Culminada)

Alcance Geográfico: Esta fase abarca la zona comprendida desde la entrada principal de la urbanización, incluyendo la vía de acceso, la subida hasta la Plaza Fuente, el Parque de Columpios, la Plaza Loza, el Mercadito, el área del Vivero, e ramo intermedio del sendero y su entrada frente a la parcela 24.

*** Infraestructura Estimada:**

* Cámaras: 21 unidades. Estas cámaras estarán estratégicamente ubicadas para cubrir los puntos de acceso, las áreas de mayor tránsito y los puntos de interés definidos. Se considerarán diferentes tipos de cámaras (fijas, domo, con visión nocturna, etc.) según las necesidades específicas de cada ubicación.

* Enlaces Inalámbricos/Cableados: 5 enlaces. Estos enlaces serán responsables de la transmisión de video y datos desde las cámaras hacia el centro de control o los puntos de almacenamiento. Se seleccionará la tecnología de enlace más adecuada (inalámbrica punto a punto/multipunto o cableado estructurado) en función de la distancia, la topografía y la disponibilidad de infraestructura.

* Cobertura Detallada: Esta fase garantizará la vigilancia completa de la entrada principal, proporcionando un registro de todos los vehículos y personas que ingresan y salen de la urbanización. La cobertura se extenderá a las áreas recreativas de la Plaza Fuente, el Parque de Columpios y la Plaza Loza, así como a la actividad comercial del Mercadito. La inclusión del Vivero y el sendero, hasta su punto intermedio y la entrada frente a la parcela 24, permitirá monitorear estas zonas de esparcimiento y tránsito peatonal.



3.2. Fase 2: Desde la [REDACTED]

* Alcance Geográfico: Esta fase se extenderá desde la [REDACTED].

* Infraestructura Estimada:

* Cámaras: 14 unidades. La ubicación de estas cámaras se planificará cuidadosamente para maximizar la cobertura a lo largo de la vía principal y las áreas circundantes, tomando en cuenta los ángulos de visión óptimos.

* Enlaces Inalámbricos/Cableados: 7 enlaces. La distribución de estos nodos de enlace se realizará estratégicamente para asegurar una transmisión de datos robusta y continua a lo largo del recorrido, considerando la topografía y posibles obstrucciones.

* Cobertura Detallada: Esta fase proporcionará vigilancia a la [REDACTED]. La disposición de las cámaras y los enlaces se diseñará para ofrecer una cobertura integral, minimizando los puntos ciegos y permitiendo el monitoreo de las parcelas ubicadas a lo largo de este tramo.

3.3. Fase 3: Desde la [REDACTED]

* Alcance Geográfico: Esta fase comprenderá la zona que se extiende desde las inmediaciones de la [REDACTED].

* Infraestructura Estimada: Aproximadamente 14 nodos (cámaras y/o enlaces). El número exacto de cámaras y enlaces se determinará durante la planificación detallada, considerando la extensión del área, la densidad de edificaciones y los puntos críticos a monitorear.

* Cobertura Detallada: El objetivo de esta fase es asegurar la vigilancia de la zona residencial cercana a la [REDACTED] incluyendo sus accesos, estacionamientos y áreas comunes.

3.4. Fase 4: Desde el [REDACTED]

* Alcance Geográfico: Esta fase abarcará el área que va desde el [REDACTED].

* Infraestructura Estimada: Aproximadamente 9 nodos (cámaras y/o enlaces). La distribución de estos nodos se realizará para cubrir de manera eficiente la vía y las áreas adyacentes entre el [REDACTED].

* Cobertura Detallada: Esta fase proporcionará vigilancia a la zona residencial y de tránsito ubicada entre el núcleo [REDACTED].

3.5. Fase 5: Desde el [REDACTED]

* Alcance Geográfico: Esta fase comprenderá la zona que se extiende desde el [REDACTED].

* Infraestructura Estimada: Aproximadamente 7 nodos (cámaras y/o enlaces). La planificación detallada definirá la ubicación precisa de estos nodos para optimizar la cobertura de esta área.

* Cobertura Detallada: El objetivo de esta fase es completar la cobertura de la zona residencial y de tránsito ubicada entre el [REDACTED].

4. Consideraciones Técnicas Generales

* Selección de Equipos: Se realizará una evaluación exhaustiva de las diferentes marcas y modelos de cámaras, equipos de grabación (NVR/DVR), sistemas de gestión de video (VMS) y tecnologías de enlace disponibles en el mercado, considerando factores como la calidad de imagen, la resistencia a las condiciones ambientales, la capacidad de almacenamiento, la escalabilidad y el costo.

* Infraestructura de Red: Se analizará la infraestructura de red existente y se planificarán las mejoras o la implementación de una red dedicada para el sistema de cámaras, garantizando un ancho de banda adecuado para la transmisión de video de alta definición.

* Alimentación Eléctrica: Se identificarán los puntos de alimentación eléctrica necesarios para cada cámara y enlace, y se tomarán las provisiones necesarias para garantizar un suministro de energía estable y seguro, incluyendo la posible implementación de sistemas de respaldo (UPS).

* Centro de Monitoreo: Se definirá la ubicación y el equipamiento del centro de monitoreo, donde se visualizarán y gestionarán las imágenes de las cámaras. Se considerarán aspectos ergonómicos y de seguridad para el personal encargado del monitoreo.

* Almacenamiento de Datos: Se determinará la capacidad de almacenamiento necesaria para cumplir con los requisitos de retención de video, considerando la cantidad de cámaras, la resolución de grabación y la frecuencia de imágenes por segundo.

* Ciberseguridad: Se implementarán medidas de seguridad robustas para proteger el sistema contra accesos no autorizados, manipulación de datos y ataques cibernéticos.

5. Cronograma Estimado

Se elaborará un cronograma detallado para cada fase del proyecto, incluyendo las actividades de planificación, adquisición de equipos, instalación, configuración, pruebas y puesta en marcha. Este cronograma se comunicará oportunamente a la comunidad de Ciudad Casarapa.

6. Presupuesto Estimado

Se elaborará un presupuesto detallado para cada fase del proyecto, incluyendo los costos de adquisición de equipos, materiales de instalación, mano de obra, licencias de software y mantenimiento. Este presupuesto se presentará para su aprobación por la Junta de Condominio.

7. Conclusiones

La implementación del sistema de cámaras de seguridad en la Urbanización Ciudad Casarapa, a través de estas cinco fases estratégicamente definidas, representa una inversión significativa en la mejora de la seguridad y la calidad de vida de sus residentes. La planificación detallada de cada fase, la selección de equipos adecuados y la implementación de una infraestructura robusta garantizarán la efectividad y la sostenibilidad del sistema a largo plazo. Se recomienda la aprobación y el apoyo continuo de este proyecto por parte de la comunidad para lograr los objetivos de seguridad propuestos.



Alfonso Manuel Lobo Martinez

RiF.: V-06851927-2

Vda Principal Vereda B, Casa Nro 36. Urb Los Naranjos
Zona 1, Guarenas Miranda - Z.P 1220
alfonsomanuellobomartinez@gmail.com
Telf.: (0424)224.91.31 / (0212) 369.84.76

PROFORMA

Nº- **0000135**

Razón Social: Urbanización Ciudad Casarapa

Fecha: 01/04/2025

Rif: J-003670251

Dirección: Calle Principal Zona Industrial Clori Guarenas Edo Miranda

Teléfono:


CANTIDAD	DESCRIPCION	MODELO	P/und	Total
1	UTP CAT 6 GRIS 100% COBRE EXTERIORES NEGRO Certificado	HDH-PFM920-6UN	190,00	190,00
14	Cámara Bullet 4MP 2,88mm Homologada	HDS-2CD1047G0-LUF	148,60	2080,40
2	SWITCH 8 PUERTOS 100 POE Homologado	HDS-3E0109PE/M	168,00	336,00
14	CAJETIN 200X200X80 ANDELI	200X200X80	29,00	406,00
5	SWITCH 5 PUERTOS 100 POE Homologado	HDS-3E0105P-EM	97,00	485,00
1	CONECTORES RJ45 CAT6 100 UND IRON COVER	WP-RJ45CAT6-EZ	18,00	18,00
6	Antena Ubiquiti Litebeam Sectorial Lap-120 120 Grados 5ghz Homologada	HLAP-120	234,00	1404,00
7	Antena Ubiquiti Litebeam Lbe-5ac-gen2 Homologada	HLBE-5AC-Gen2	188,00	1316,00
10	Cable eléctrico Cabel 100% cobre	Eléctrico	180,00	1800,00
1	Instalación Equipos de seguridad, Cámaras, enlaces de Nodos configuración y Adiestramiento	Ing. de Enlace y Programación	1500,00	1500,00
1	Materiales instalación Consumibles Tirrac, anclajes, Ramplús, Mechas; Sujetadores, Prensaes de Zona, Aisladores, Tirro Aislante, Teipe Cobra, Termo Incogibles, Prensaes Ros cables, Anilletas de Bronce, Rectificadores de Potencias Variables, Aisladores de Qr, Cables pst, terminales, conectores Macho, Conectores Hembras, tomas 270 Levinton	Varios	450,00	450,00

Sub Total 9985,40

Impuesto 1597,66

Total 11583,06

PROFORMA
N°- 0000135

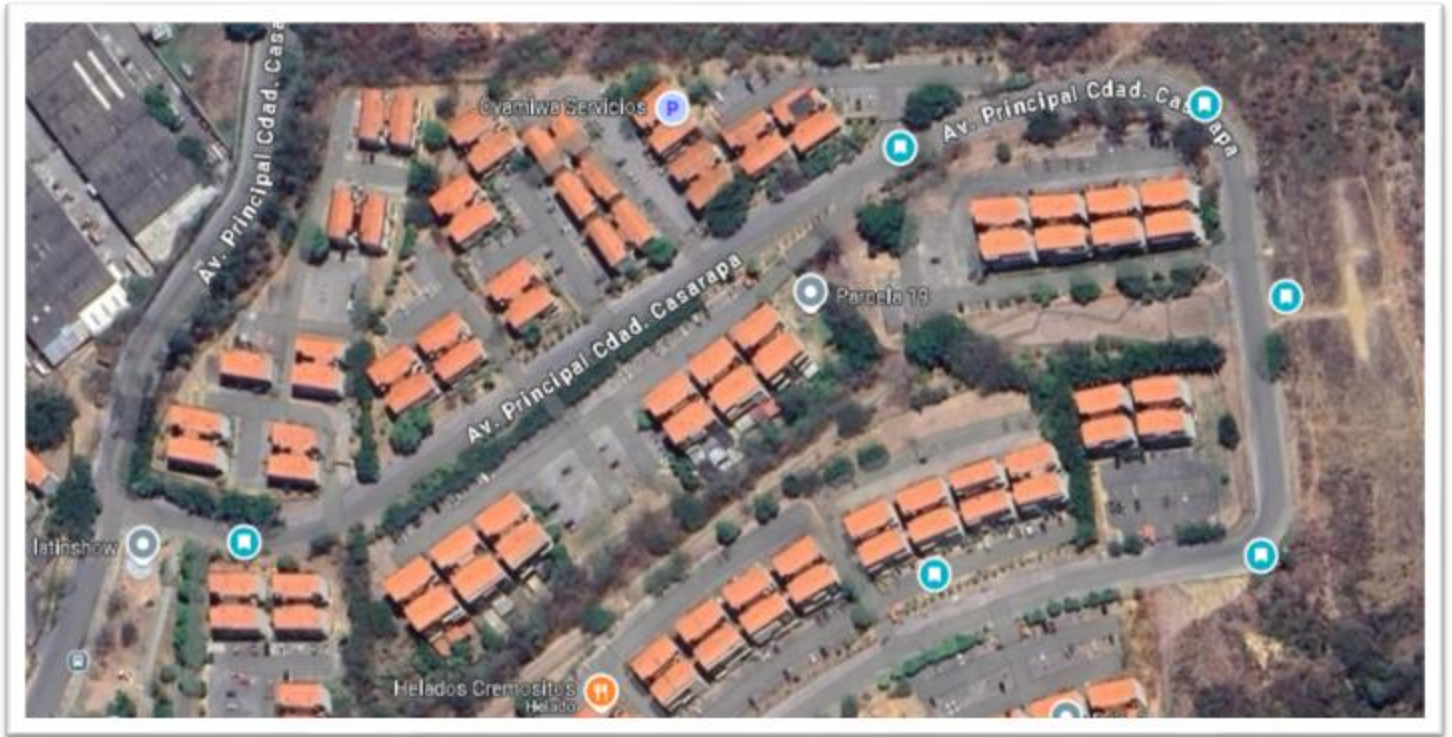

INFORME TÉCNICO

Asunto: Implementación de Nodos Inalámbricos con Cámaras Integradas para el Sistema de Vigilancia de Ciudad Casarapa

1. Introducción

Este informe técnico detalla la implementación de nodos inalámbricos con cámaras integradas para mejorar la cobertura y el alcance del sistema de vigilancia en Ciudad Casarapa. Se utilizarán antenas Ubiquiti y cámaras de 4MP, aprovechando la infraestructura de postes de iluminación existentes y la alimentación eléctrica de las garitas de entrada de los puntos cercanos.

2. Objetivos

- Ampliar la cobertura del sistema de vigilancia a áreas no cubiertas actualmente.
- Mejorar la calidad de la señal y la estabilidad de la conexión.
- Implementar una solución robusta y confiable con cámaras integradas en cada nodo.
- Incrementar la capacidad de vigilancia con cámaras de mayor resolución (4MP).

PROFORMA
Nº- 0000135

3. Descripción de la Solución

Se instalarán nodos inalámbricos con cámaras integradas en postes de iluminación a lo largo de la vía principal de Ciudad Casarapa, desde la fuente hasta la parcela 21. Cada nodo estará compuesto por:

- **Antena Sectorial Ubiquiti:** Encargada de enviar la señal al siguiente nodo. Homologada
- **Antena Direccional Ubiquiti 5AC-Gen2:** Establecerá el enlace punto a punto con la antena sectorial del nodo anterior. Homologada
- **Dos (2) Cámaras de 4MP:** Fijas a las tapas de las cajas de intemperie, proporcionando cobertura de vigilancia en el área del nodo.
- **Dos (2) Cajas de Intemperie (200x200 mm):**
 - Una caja contendrá el PoE (Power over Ethernet) para las antenas.
 - La otra caja contendrá el switch PoE y la conexión eléctrica.
- **Flejes Metálicos:** Se utilizarán para fijar las cajas a los postes de iluminación.

4. Ubicación y Altura

- Los nodos se ubicarán en postes de iluminación estratégicos, a una altura aproximada de 4 metros.
- Se seleccionarán puntos que minimicen los obstáculos (como árboles) para garantizar una buena señal.
- La separación entre nodos será de aproximadamente 200 metros. Se deberá realizar un estudio de campo para determinar la cantidad exacta de nodos necesarios.

5. Conexión y Alimentación

- Los nodos se conectarán mediante enlaces punto a punto utilizando las antenas direccionales.
- La alimentación eléctrica se tomará de la acometida de 110 voltios de parcelas cercanas a cada nodo. Se detallará el método de una fase posterior del proyecto, priorizando la seguridad y el cumplimiento de normativas eléctricas.

6. Equipos y Materiales

- Antenas sectoriales Ubiquiti LAP-120.
- Antenas direccionales Ubiquiti 5AC-Gen2.
- Cámaras de 4MP (modelo a especificar, con características adecuadas para exteriores y visión nocturna).
- Cajas de intemperie de 200x200 mm (con grado de protección IP adecuado).
- PoE (Power over Ethernet).
- Switch PoE.
- Flejes metálicos.
- Cableado y materiales de conexión eléctrica (a especificar, incluyendo tipo de cable, canalizaciones, etc.).

7. Próximos Pasos

- **Planificación Detallada:** Se realizará un estudio de campo para determinar la ubicación exacta de cada nodo, la mejor forma de realizar el cableado eléctrico y la configuración óptima de las cámaras.
- **Diseño de la Red:** Se elaborará un diagrama de la red de nodos, mostrando la ubicación y la conexión entre ellos, así como la cobertura de las cámaras.

PROFORMA

N°- 00000135

- **Selección de Equipos:** Se seleccionarán los modelos específicos de cámaras y antenas, teniendo en cuenta las necesidades del proyecto y el presupuesto disponible.
- **Presupuesto:** Se elaborará un presupuesto detallado de los costos de equipos, materiales e instalación.
- **Cronograma:** Se establecerá un cronograma para la implementación de los nodos.

8. Conclusiones

La implementación de nodos inalámbricos con cámaras integradas permitirá ampliar significativamente la cobertura del sistema de vigilancia de Ciudad Casarapa, mejorando la seguridad y la vigilancia en la comunidad. Se utilizarán equipos de alta calidad y se aprovechará la infraestructura existente para minimizar los costos y el impacto en la comunidad. La integración de cámaras de 4MP en cada nodo proporcionará imágenes de mayor calidad para una mejor identificación y seguimiento.

Este informe técnico es un resumen inicial del proyecto. Se proporcionará información más detallada a medida que avance la planificación y la implementación. Es crucial realizar un estudio de campo y una planificación detallada antes de la implementación para asegurar el éxito del proyecto.

PROFORMA
N°- 0000135



Antena Direccional

Antena Sectorial 120 grados

Antenas Sectoriales

Las antenas sectoriales son dispositivos diseñados para transmitir y recibir señales en un área específica o "sector". Generalmente, tienen un patrón de radiación más amplio que las antenas direccionales, cubriendo un ángulo de 60 a 120 grados. Son ideales para aplicaciones donde se necesita cubrir áreas amplias, como en redes inalámbricas, torres de telefonía móvil y sistemas de vigilancia. Su diseño permite conectar múltiples usuarios en una misma zona sin interferencias significativas.

Antenas Direccionales

Las antenas direccionales están diseñadas para concentrar la señal en una dirección específica, lo que les permite alcanzar distancias mayores y mejorar la calidad de la comunicación. Tienen un patrón de radiación más estrecho, lo que significa que son ideales para enlaces punto a punto o para cubrir áreas específicas con alta precisión. Se utilizan comúnmente en aplicaciones como comunicaciones de larga distancia, enlaces entre edificios y sistemas de monitoreo donde se requiere un enfoque preciso.

PROFORMA
Nº- 0000135



HDS-2CD1023G0E-I

Cámaras IP Hikvision

Las cámaras IP Hikvision son dispositivos de videovigilancia que utilizan tecnología de red para transmitir y recibir datos a través de Internet. Estas cámaras están diseñadas para ofrecer alta calidad de imagen, flexibilidad en la instalación y fácil integración con sistemas de seguridad existentes.

Ventajas:

1. **Alta Resolución:** Ofrecen imágenes nítidas y claras, con resoluciones que pueden llegar hasta 4K, lo que permite una mejor identificación de personas y objetos.
2. **Acceso Remoto:** Permiten el monitoreo en tiempo real desde cualquier lugar a través de aplicaciones móviles o plataformas web, facilitando la supervisión continua.
3. **Facilidad de Instalación:** Al ser cámaras IP, se pueden instalar utilizando cableado Ethernet (UTP), lo que simplifica la instalación y reduce costos.
4. **Funcionalidades Avanzadas:** Muchas cámaras Hikvision incluyen características como visión nocturna, detección de movimiento, análisis inteligente (como reconocimiento facial) y grabación en la nube.
5. **Escalabilidad:** Se pueden integrar fácilmente en sistemas existentes y expandirse según las necesidades del usuario, permitiendo agregar más cámaras sin complicaciones.
6. **Conectividad:** Pueden conectarse a redes Wi-Fi o mediante cableado, ofreciendo flexibilidad en su ubicación.

Estas características hacen que las cámaras IP Hikvision sean una opción popular para sistemas de seguridad tanto en entornos residenciales como comerciales. Si necesitas más información sobre un modelo específico o características adicionales, házmelo saber

PROFORMA
Nº- 0000135



Descripción del Switch Capa 2, 8 Puertos 100M PoE Hikvision - Modelo DS-3E0109P-E y DS-3E0105P-E

El **Switch Capa 2** de Hikvision modelo **DS-3E0109P-E (C)** es una solución avanzada para la gestión de redes que ofrece características específicas para optimizar la transmisión de datos y energía a dispositivos conectados. A continuación se detallan sus principales características y beneficios:

Características Principales:

- **Número de Puertos:** 8 puertos PoE (Power over Ethernet) que permiten la conexión y alimentación de dispositivos como cámaras IP, puntos de acceso y otros equipos compatibles.
- **Gestión Inteligente de PoE:** Este switch cuenta con un sistema inteligente que gestiona la fuente de alimentación. Cuando la demanda supera el límite, los puertos PoE ajustan automáticamente la distribución de energía, lo que ayuda a prolongar la vida útil del dispositivo.
- **Transmisión PoE de Largo Alcance:** Capaz de alcanzar distancias de hasta **300 metros** entre los dispositivos conectados (IPC) y el switch, lo que permite una mayor flexibilidad en la instalación.
- **Fuente de Alimentación Adaptable:** Diseñado con una fuente de alimentación de 4/8 núcleos que minimiza la pérdida de energía en los cables, asegurando un suministro eficiente.
- **Protección contra Sobretensiones:** Incorpora protección contra sobretensiones de hasta **6kV**, mejorando la confiabilidad del switch en entornos hostiles y protegiendo los equipos conectados contra picos eléctricos.
- **Diseño para Transmisión de Video:** El puerto VIP (Video Intelligent Port) garantiza la transmisión prioritaria de datos importantes, especialmente durante situaciones de congestión en la red, asegurando que las aplicaciones críticas como videovigilancia mantengan su rendimiento.

Beneficios:

1. **Fiabilidad Mejorada:** La protección contra sobretensiones y el diseño robusto hacen que este switch sea ideal para su uso en entornos desafiantes.
2. **Flexibilidad en Instalaciones:** Con capacidad para transmitir datos y energía a largas distancias, es perfecto para instalaciones donde el cableado puede ser un desafío.
3. **Optimización Energética:** La gestión inteligente del PoE no solo prolonga la vida útil del switch, sino que también asegura un uso eficiente de la energía.
4. **Prioridad en Datos Críticos:** La función VIP permite asegurar que las transmisiones más importantes no se vean afectadas por congestiones en la red.



COMITÉ DE
SERVICIOS GENERALES
CIUDAD CASARAPA

OBRA: CAMARAS 1ERA. Y 2DA. FASE

Nº.	PROVEEDOR	FACTURA Nº.	FECHA	DESCRIPCION / CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IVA 16%	TOTAL
1	Alfonso Lobo Martínez (78)	132	18/06/2025	Instalación y puesta en marcha nodos de vigilancia CCTV y radios de enlaces desde parcela 1-2 hasta parcela 21 baja	853.943,00	136.630,88	990.573,88
2	Alfonso Lobo Martínez (78)	122	06/02/2025	Venta e instalación de NVR-SERIE 7200 HIK visión con 22 cámaras y 8 antenas de enlace	448.002,96	71.680,47	519.683,43
TOTALES GENERALES					1.301.945,96	208.311,35	1.510.257,31



Comité de
Servicios Generales
Comisión de Obras y Servicios

Alfonso Manuel Lobo Martínez

RIF.: V-06851927-2

Vda. Principal Vereda B. Casa Nro. 36, Urb. Los Naranjos
Zona 1, Guaremas Miranda - Z.P. 1220
Correo: a_m_lobo@hotmail.com
Telf.: (0424) 224.91.31 / (0212) 369.84.76

Lugar de Emisión	Día	Mes	Año
Guaremas	18	06	2025

FACTURA N° 000132 Nro. de CONTROL 00- 000132

Nombre o Razón Social	Urbanización Ciudad Ousampa
Domicilio Fiscal:	Zona Industrial Calle Principal Clorí
	Guaremas - Edo Miranda
Telefonos:	
RIF / C.I.:	3003670251
Condiciones de Pago:	

CANT.	CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	TOTAL
	Instalación y Puesta en Marcha	853943	853943
	Nodos de Vigilancia CCTV y		
	Radio enlaces desde		
	Parcela 1-3 Hasta Parcela 21 Baja		

Forma de Pago: Efectivo <input type="checkbox"/> T.C. <input type="checkbox"/> T.D. <input type="checkbox"/>	Sub - Total Bs.	853943
Cheque <input type="checkbox"/> Transf. <input type="checkbox"/>	I.V.A. 16% Sobre Bs.	136630,88
N°	Total a Pagar Bs.	990573,88
Banco:		

IMPRESO POR: INDUSTRIAS GRÁFICAS D Y H, C.A. TELFS.: 983.81.58 / 382.42.01, AV. REGULO FRANQUIZ, SECTOR PUEBLO ARRIBA, LOCAL 16, GUAREMAS - EDO. MIRANDA. RIF: J-31303484-9. Providencia: SENIAT/01/01083 del 10-12-2008 / Factura desde el N° 000101 hasta el N° 000200 / Control desde el N° 00-000101 hasta el N° 00-000200 / Fecha: 21-01-2022 / Región Capital

Este Documento va sin Tachadura ni Enmienda

ORIGINAL - CLIENTE

BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen	
Fecha	23/04/2025
Numero de Identificación	76451111
Monto Abonado	164.740,00
Beneficiario	ALFONSO LOBO
Cuenta Abonada	0163*****22*****3062
Banco Pertenencia	BANCO DEL TESORO, C.A.
E-mail Beneficiario	
Referencia	ALFONSO LOBO
Canal Utilizado	Provinet

Gracias por utilizar Provinet. Su Banca por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-08-81

BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen	
Fecha	08/05/2025
Numero de Identificación	77521711
Monto Abonado	229.775,00
Beneficiario	ALFONSO LOBO
Cuenta Abonada	0163*****22*****3062
Banco Pertenencia	BANCO DEL TESORO, C.A.
E-mail Beneficiario	
Referencia	ALFONSO LOBO
Canal Utilizado	Provinet

Gracias por utilizar Provinet. Su Banca por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-08-81

BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen	
Fecha	20/05/2025
Numero de Identificación	78392884
Monto Abonado	282.978,00
Beneficiario	ALFONSO LOBO
Cuenta Abonada	0163*****22*****3062
Banco Pertenencia	BANCO DEL TESORO, C.A.
E-mail Beneficiario	
Referencia	ALFONSO LOBO
Canal Utilizado	Provinet

Gracias por utilizar Provinet. Su Banca por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-08-81

BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen	
Fecha	04/04/2025
Numero de Identificación	75254741
Monto Abonado	176.450,00
Beneficiario	ALFONSO LOBO
Cuenta Abonada	0163*****22*****3062
Banco Pertenencia	BANCO DEL TESORO, C.A.
E-mail Beneficiario	
Referencia	ALFONSO LOBO
Canal Utilizado	Provinet

Gracias por utilizar Provinet. Su Banca por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-08-81

INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA NODOS DE VIGILANCIA CCTV Y
RADIOS DE ENLACES DESDE PARCELA 1-2 HASTA PARCELA 21 BAJA

BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen	
Fecha	18/06/2025
Numero de Identificación	80516108
Monto Abonado	128.127,28
Beneficiario	ALFONSO LOBO
Cuenta Abonada	0163****22****3062
Banco Pertenencia	BANCO DEL TESORO, C.A.
E-mail Beneficiario	
Referencia	ALFONSO LOBO
Canal Utilizado	Provinet

Gracias por utilizar Provinet. Su Banca por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-08-81





